


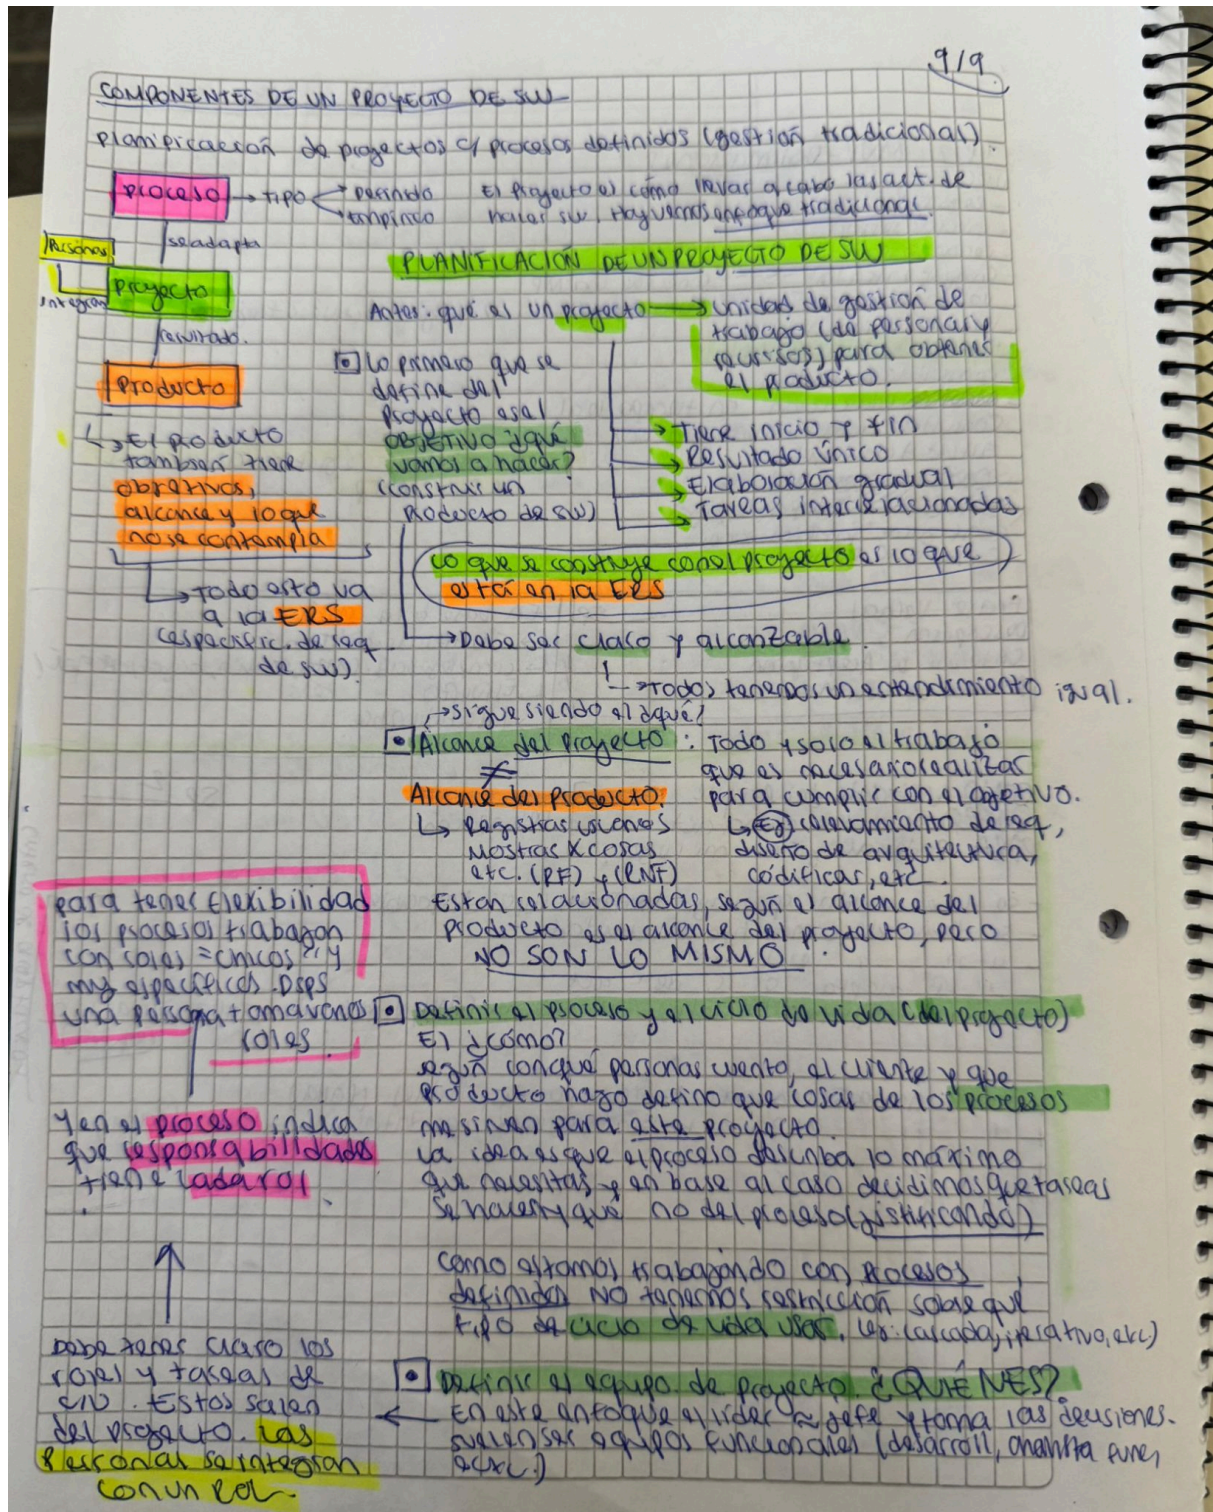

Acá estima el líder o alguien que no va a hacer el trabajo
En este entoque la estimación es absoluta. En el día no.

Estimación

Siempre la estimación tiene asociado un factor de PROBABILIDAD.
En los proyectos de gestión típicos.

Las estimaciones tienen que ser un número

Hay que estimar sobre algo que tengamos PRONTO en el proceso (los req.)

Para estimar tamaño se usan los CU y que tan difícil o grande es C/U

$CU \times \text{complejidad}$

Proceso
Orden:

- Primero se estima el tamaño del producto
- Después el esfuerzo (proyectos)
- Otras personas lineales
- Tiempo / calendario (proyecto)
- Costos
- Lo anterior conduce al costo.
- Recursos críticos: recursos que necesitan en una cont. que no tengo (ej: ancho de banda)
- Siempre o delante el desarrollo del sistema
- Hay que ver como lidiamos con esto.

En el esfuerzo vamos cuantas horas va a usar una persona en una tarea

$\text{Horas} / \text{Personal lineal}$

A estas horas las estimamos en un calendario

En el calendario pongo las horas que defini en el esfuerzo
Seo considera las horas productivas de trabajo
Dividiendo qué % de horas se dedica a la actividad
Y también hay que considerar el índice de sub-pomiento entre ellas

Para calcular el costo nos basamos en el recurso más significativo
Usamos las horas de esfuerzo → poner ahí a un % sin especificar
o distinguiendo cuanto gana C/U por hora: analista, programador, etc.

- 80% esfuerzo
- 10% complejidad
- 10% resto: licencias, etc.


Triple Restricción

las 3 dimensiones sobre las cuáles estimar

¿Qué? Alcance
Tiempo
Recursos / Costos

Lo primero que se sacrifica en este es que sea la calidad


NO ENTRAR EN PROYECTOS SI NO PUEDO CONTROLAR AL MENOS 2



El alcance está siempre del lado del cliente, porque son los req. lo que él quiere.

Una vez acordados los alcances denunciar el tiempo y los recursos si se aceptan y se pueden hacer cambios pero habría que reestimar el tiempo y los costos

El agilismo propone req. ágiles (no fijos)



tiempo fijo

→ Iteraciones de duración fija
→ No cambio la fecha y presupuesto
→ si no llega presento menos alcance

→ No se puede cambiar el alcance durante un Sprint (que el cliente cambia los req.)

El PD usa un ciclo iterativo, incremental de alcance fijo → hasta que el alcance no se cumple la iteración NO TERMINA

Scrum

con duración fija. Time box → El tiempo está limitado a una caja

TRADICIONAL CON CICLO DE VIDA ITERATIVO INCREMENTAL.

Modelo con ciclo de vida ITERATIVO INCREMENTAL

Ver la grande scrum

1. Caracterización / Proposición del proyecto

Se anticipa con mucho detalle que tarea, quién a hacer y cuándo

* Asignación de recursos → al inicio de proyecto asigna las tareas

Asignación de recursos → la mide al proyecto según sus tiempos.

* Anticipada

2. Riesgos

3. Seguimiento y control del proyecto

Se planifica: cada cuánto se hace el seguimiento, que informes necesites, etc.

4. Métricas

Números objetivos

ej: ciclos de testing de un producto, hrs de programación, etc.

Antes de proyecto

agilismo
tradicional

El proceso (en conjunto)
